
2026 年 11 月 – 2027 年 4 月末

フェーズ④ マーケティング・採用 — 2/1 のリリースから逆算する

11 月末コンセプト確定 → 年内 HP 骨子 → 2/1 大使館リリース・ Web 予約開始 → 2〜3 月 SNS 本格始動・レセプション立案 → 4 月中旬引渡し＋予備日 1 週間 → 搬入・トレーニング 3 日 → 4 月下旬〜末 開業

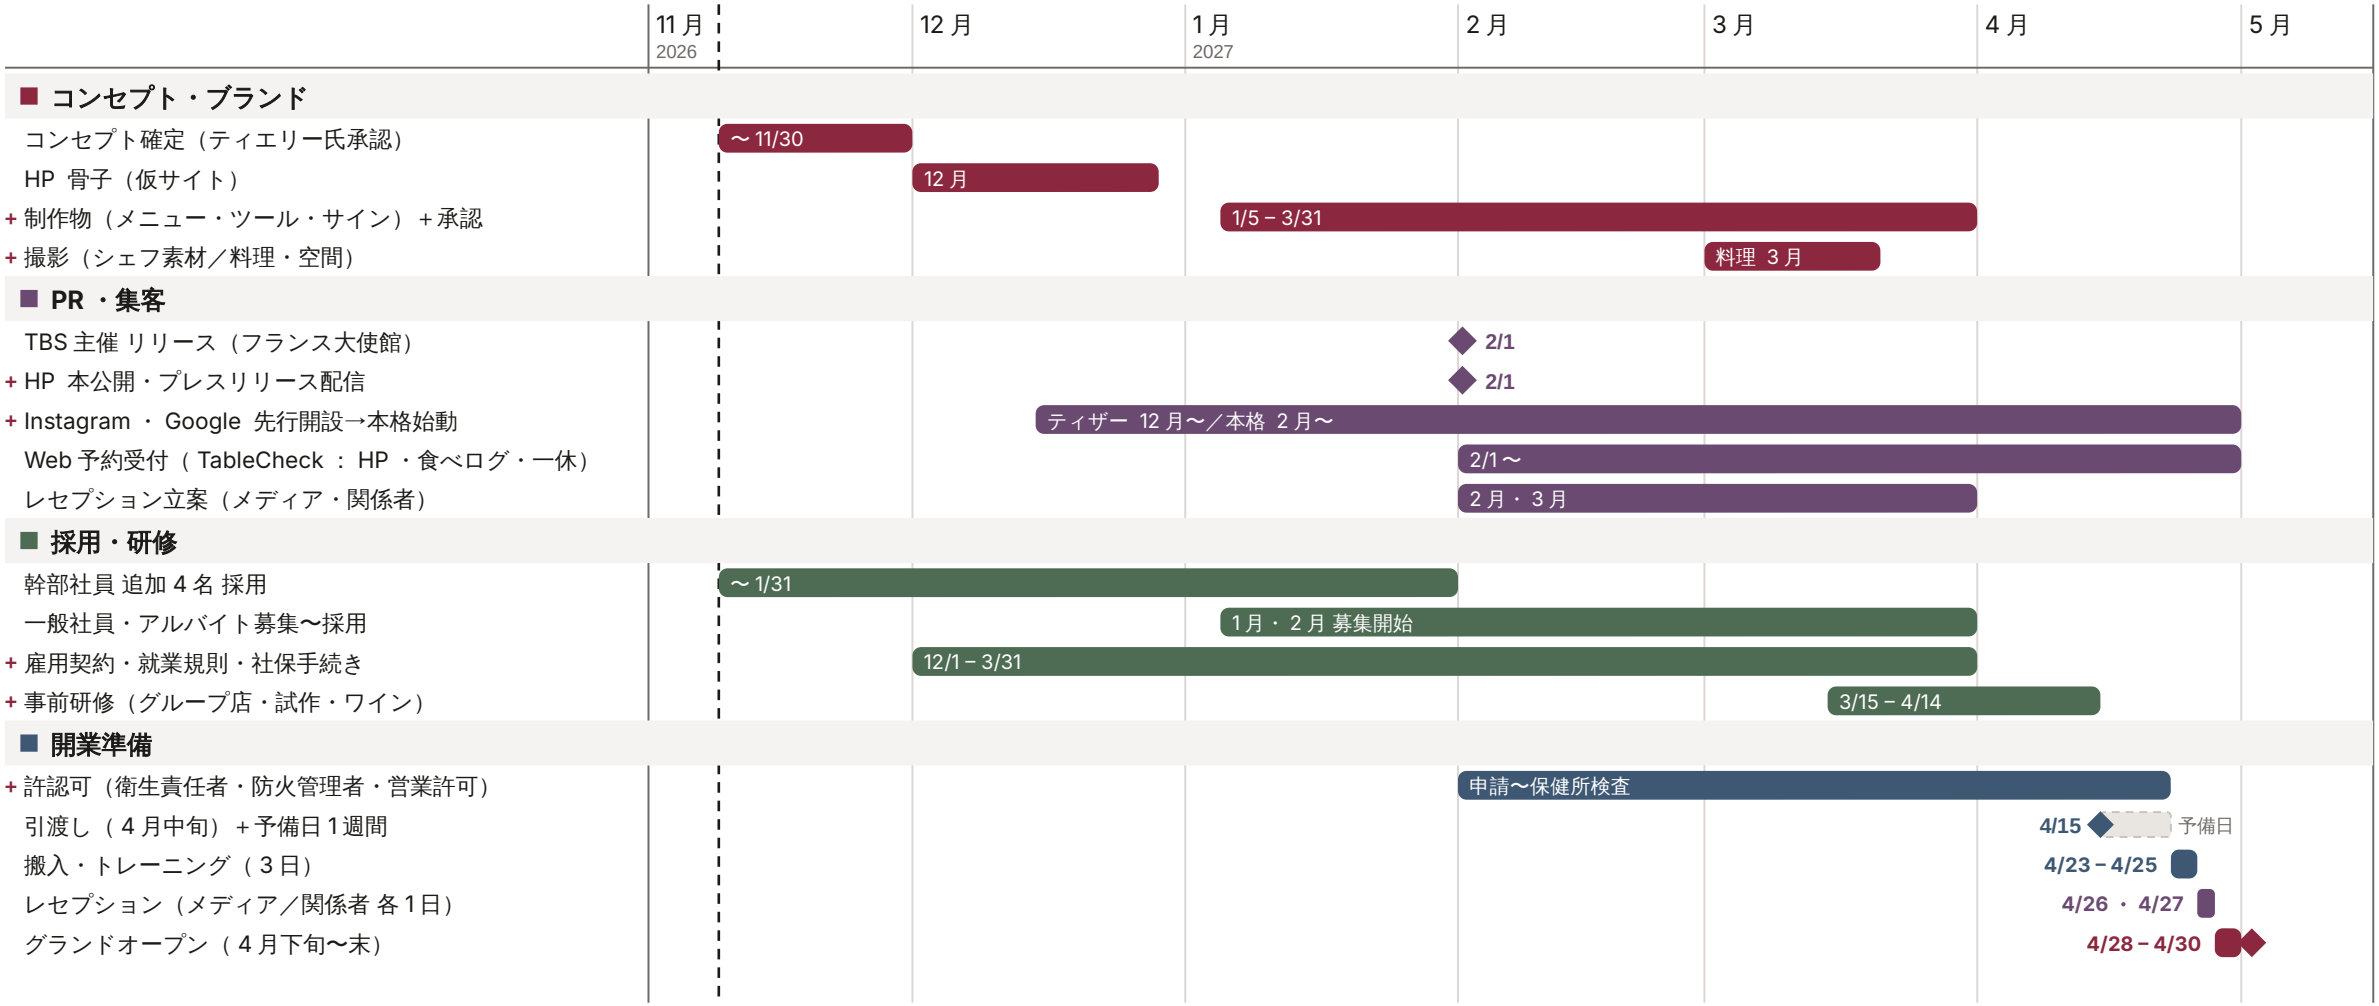


※ 「＋」印の項目（制作物・撮影・ HP 本公開・労務・事前研修・許認可）は抜け漏れ防止のため追加。現場トレーニングは 3 日のため、 3/15 〜 4/14 にグループ店で事前研修を行う。引渡し日の確定後、レセプション日と開業日の予約枠を確定する。

November 2026 – end of April 2027

Phase 4: Marketing & recruitment — working back from the 1 Feb launch

Concept sign-off end Nov → website outline by year-end → 1 Feb launch at the French Embassy & online booking → Feb–Mar social media & reception planning → mid-April handover + 1-week buffer → 3 days move-in & training → opening late April

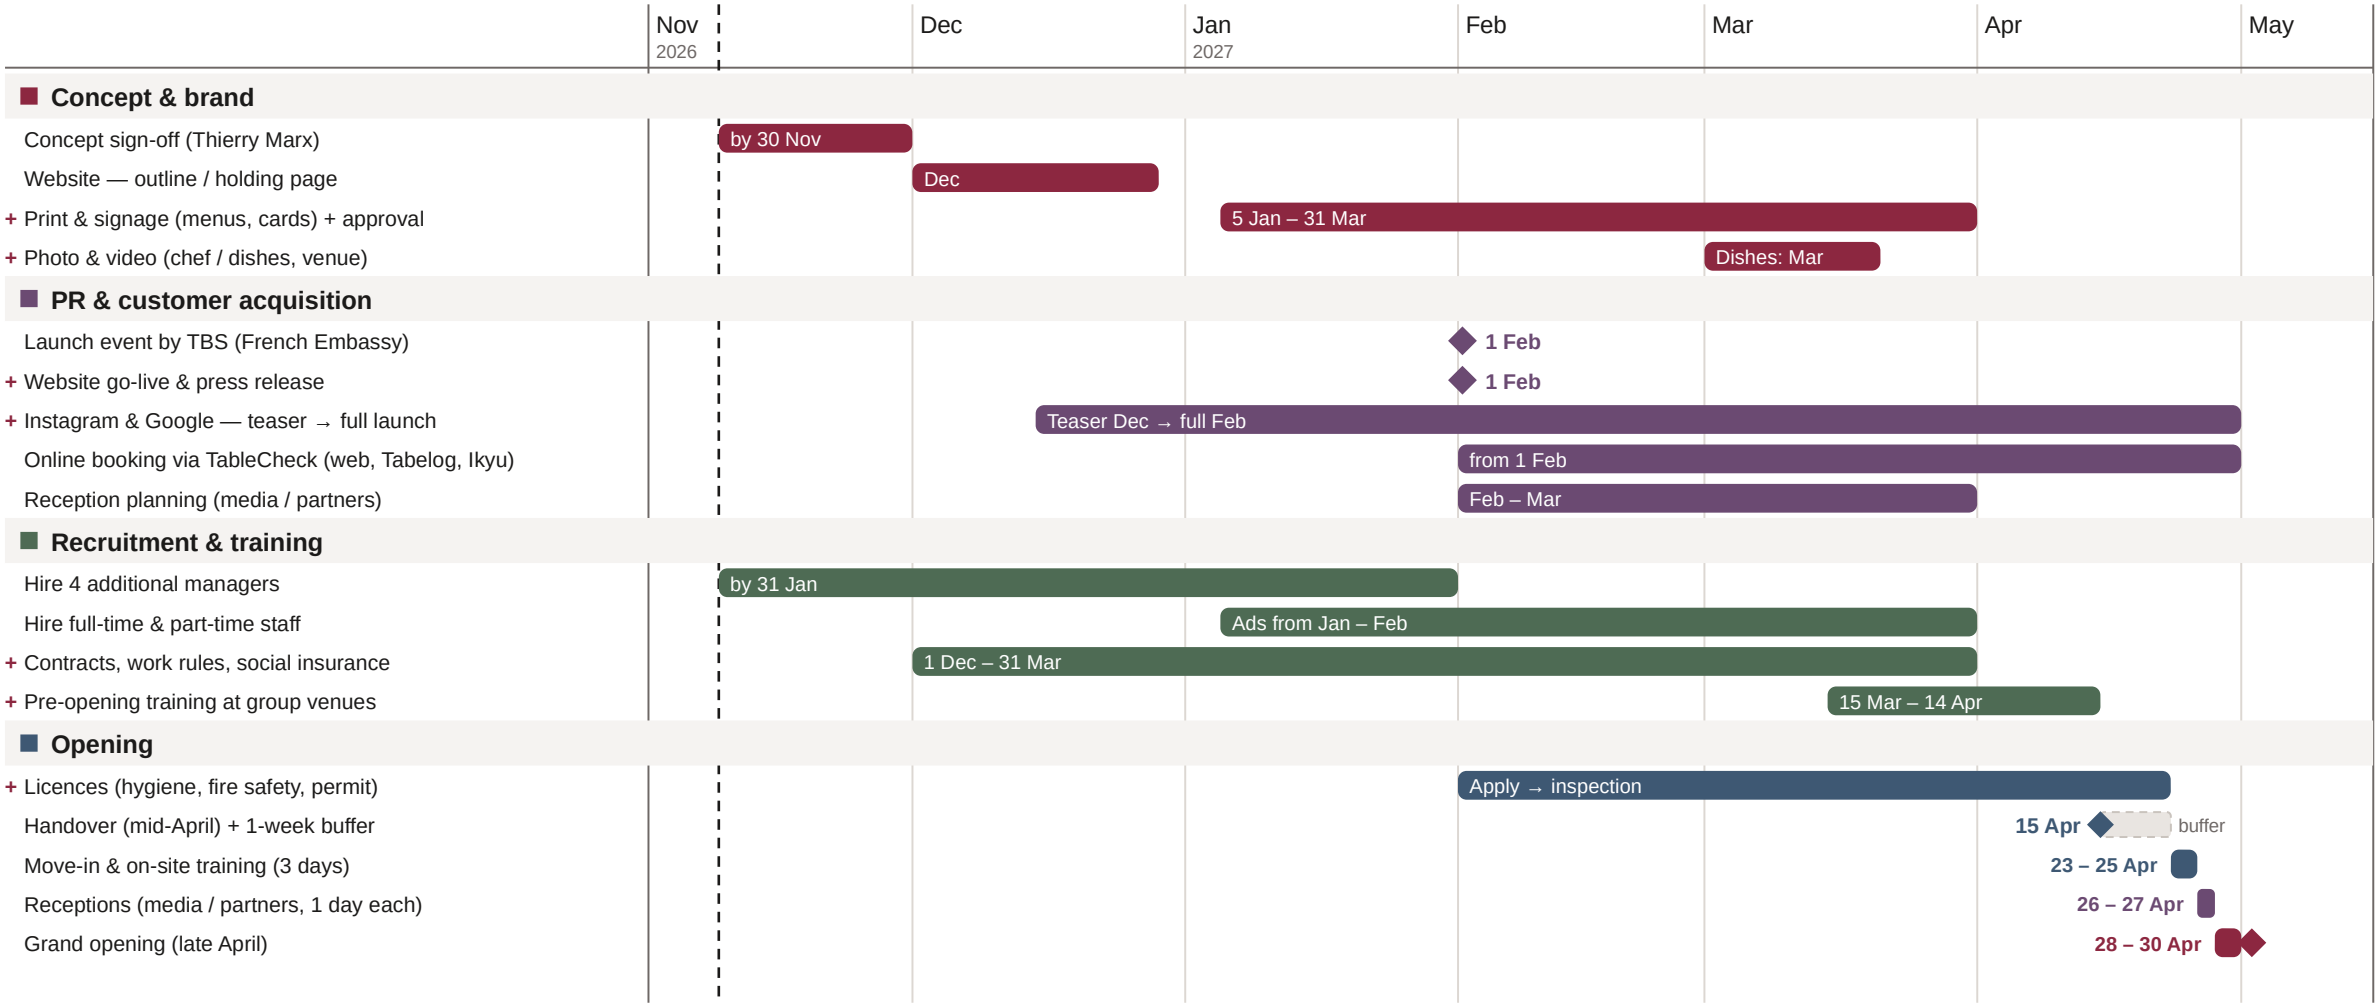

Items marked "+" added for completeness: print & signage, photography, website go-live, HR set-up, pre-opening training and licences. On-site training is only 3 days, so staff train at WineBank group venues from 15 Mar to 14 Apr. Reception dates and the first bookable day are fixed once the handover date is confirmed.
